


## VIA CAMPOSANTO - Annunciata una nuova data di apertura: il 29 novembre

**PADERNO** - L'ultimissimo aggiornamento di poche ore fa parla di "consegna finale delle opere per il 29 novembre 2023". Significa che il ponte di via Camposanto rimarrà chiuso praticamente per tutto l'autunno. All'ulteriore dilatazione dei tempi, si aggiunge anche quella dei costi. Ci sarebbe un aumento di 50mila euro per la seconda variante

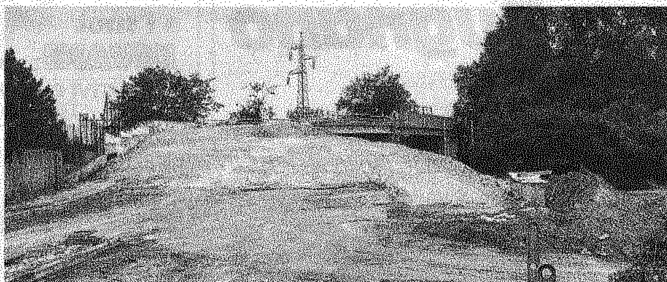

alle reti metalliche già previste verrà inserito un parapetto in metallo. Una nuova modifica che "comporta necessariamente un maggiore apporto di terreno di riempimento per il sottofondo". Dopo i costi, anche la variabile dei tempi di esecuzione è cambiata con le nuove modifiche apportate al progetto. Se tutto fosse filato liscio, l'apertura era

# I temporali hanno sciolto la terra Aumentano ritardi e costi del ponte

in corso d'opera. Nulla a che vedere con l'aumento del 25% che si è registrato a fine 2022. Tuttavia, il costo totale di metà ponte supera per ora il milione e mezzo. A questo si arriva dopo nuovi imprevisti che si sono registrati nel cantiere di via Camposanto. "Gli eventi temporaleschi estremi dei mesi di luglio e agosto hanno causato una progressiva diminuzione del volume delle terre presenti in cantiere", si legge negli atti ufficiali da poche ore pubblicati dal Comune. Queste sarebbero dovute servire per il riempimento della rampa dopo la consegna delle travi avvenuta poco prima di Ferragosto. I temporali avrebbero reso "inutilizzabili queste terre",

costringendo a un'ulteriore integrazione. Non solo, ma le piogge abbondanti hanno evidenziato un altro problema. "Si è proceduto a una rivalutazione della capacità di conferimento della rete di smaltimento delle acque

meteoriche", si legge sempre nella relazione. A questo punto, è stato previsto l'inserimento di "ulteriori caditoie". Nel frattempo, i tecnici hanno evidenziato la necessità di "modificare la livelletta stradale

eliminando la "cuspide in corrispondenza tra la rampa e l'impalcato" e di conseguenza "innalzare i muri di contenimento a confine della proprietà Ballabio, nonché di perfezionare la percorribilità ciclopedonale". Così oltre

prevista per il 15 ottobre. Ma per "l'esecuzione delle opere proposte dalla variante, vengono concessi 45 giorni", si legge nelle relazioni. Di conseguenza "la consegna finale viene stabilita per il 29 novembre".
